Interreg

Cofinanțat de
UNIUNEA EUROPEANĂ

România – Bulgaria

Proiectul “Inițiativă transfrontalieră pentru formarea și implicarea comunităților religioase” este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Interreg VI-A România–Bulgaria.

CADRUL LOGIC (MATRICEA) – CUM SĂ ÎL CREĂM ȘI SĂ ÎL UTILIZĂM



INTRODUCTION

Ce este un cadru logic?

Un instrument pentru proiectarea și gestionarea structurată.



STRUCTURA CADRULUI LOGIC

LOGICĂ	INDICATORI	SURSE DE VERIFICARE	IPOTEZE
OBIECTIV GENERAL			
OBIECTIVE SPECIFICE			
REZULTATE			
ACTIVITĂȚI			

OBIECTIV GENERAL

Care este contribuția pe termen lung a proiectului?

Legătura cu strategii, politici, planuri.



OBIECTIVE SPECIFICE

Ce anume va realiza proiectul?

Abordarea problemei/nevoilor grupurilor țintă.



REZULTATE AȘTEPTATE

Efecte concrete ale activităților

Număr de persoane instruite, companii create, parteneriate semnate



ACTIVITĂȚI ȘI RESURSE

Cum vor fi obținute rezultatele?

Instruiri, consultații, parteneriate.



INDICATORI

Indicatori obiectiv verificabili

SMART: Specifici, Măsurabili, Atingibili, Relevanți, Încadrați în timp



IPOTEZE ȘI RISCURI

Ce este dincolo de controlul nostru?

Care condiții externe ar putea amenința succesul?



SECVENȚĂ LOGICĂ

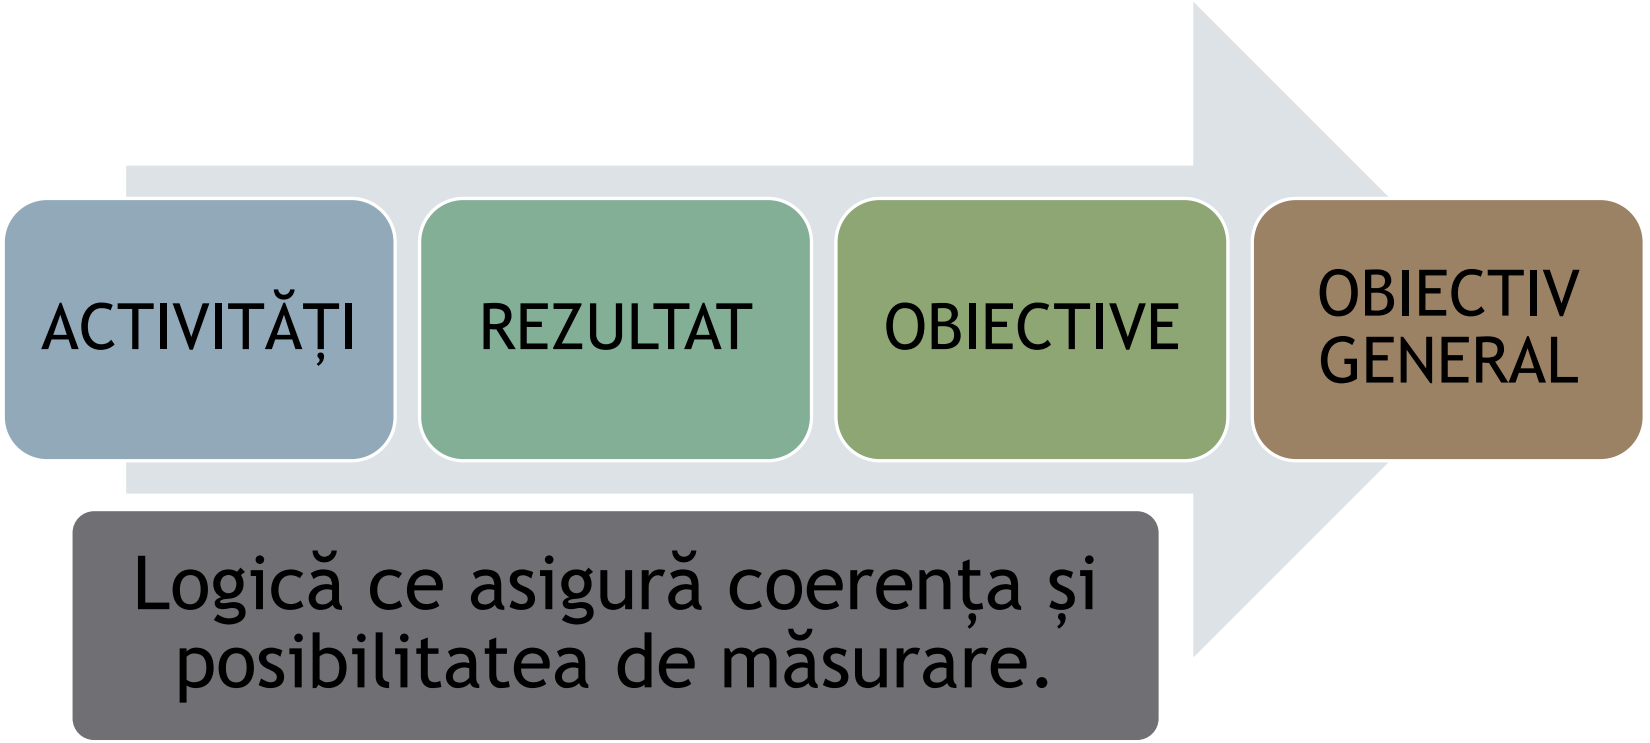

DEFINIREA ACTIVITĂȚILOR



INTRODUCERE

Definirea activităților:

Legătura dintre obiective și acțiuni

✔ Plan de execuție

Bază pentru calendar, resurse și control

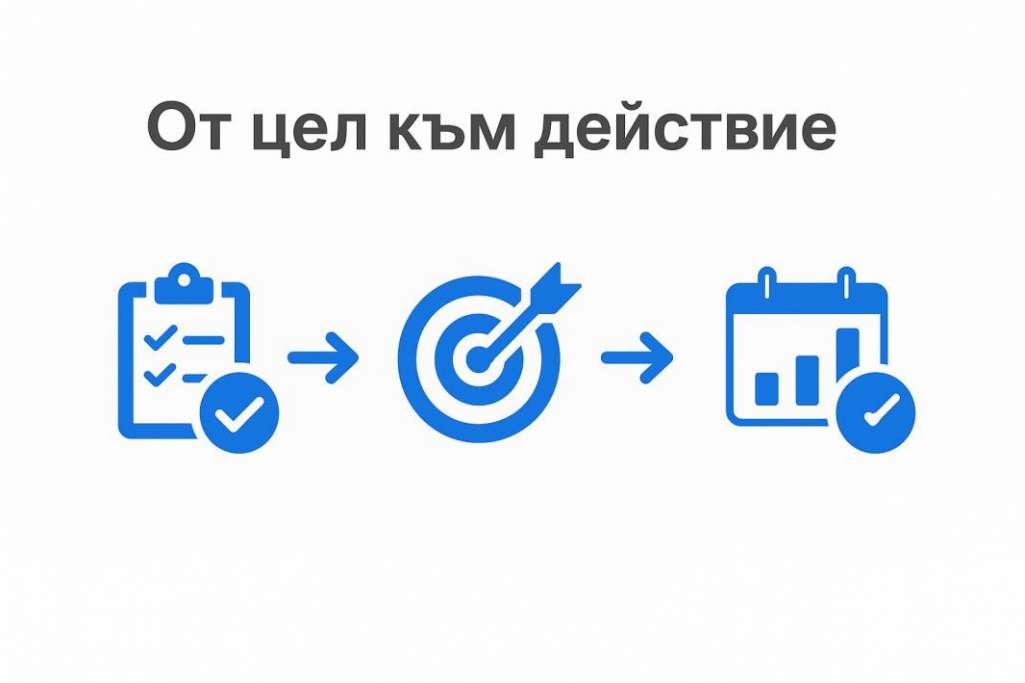

CE ESTE O ACTIVITATE?

Activitate = acțiune specifică

Conduce la un rezultat

Măsurabilă și fezabilă

Parte a unui pachet de lucru



ȘASE ÎNTREBĂRI PENTRU FIECARE ACTIVITATE?

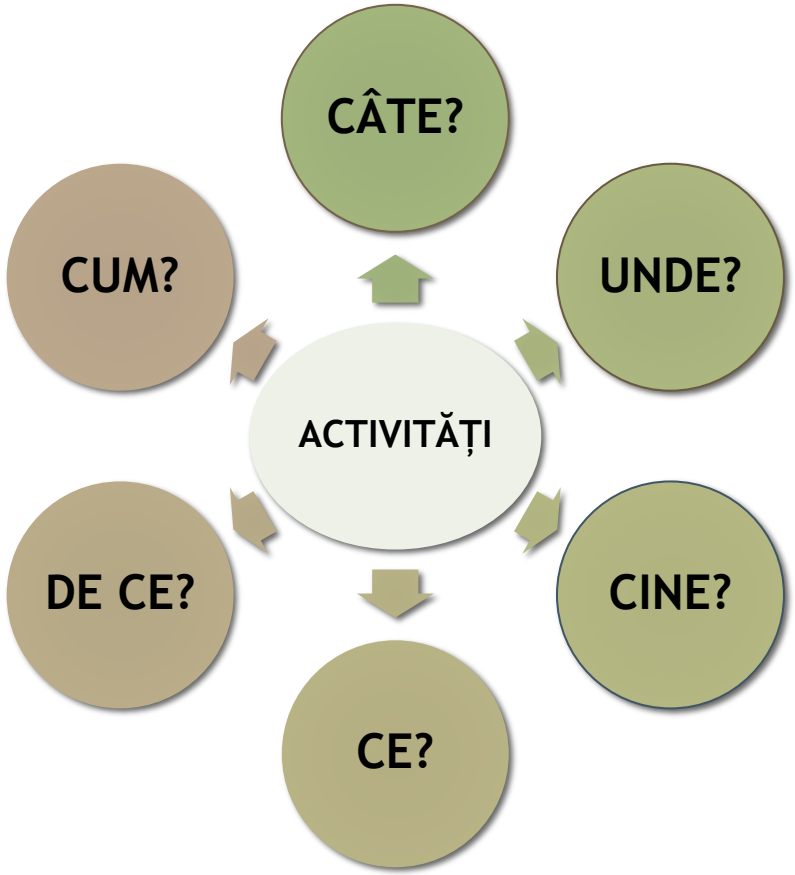

EXEMPLU: DEZVOLTAREA LECȚIILOR ONLINE

Exemplu de Activitate:

Ce: Crearea lecțiilor online
De ce: Îmbunătățirea competențelor digitale
Cum: Printr-o platformă interactivă
Cine: Echipa de formatori și dezvoltatori
Durata: Un an
Cost: 20.000 EUR



DEPENDENȚE ÎNTRE ACTIVITĂȚI

Activități interconectate:

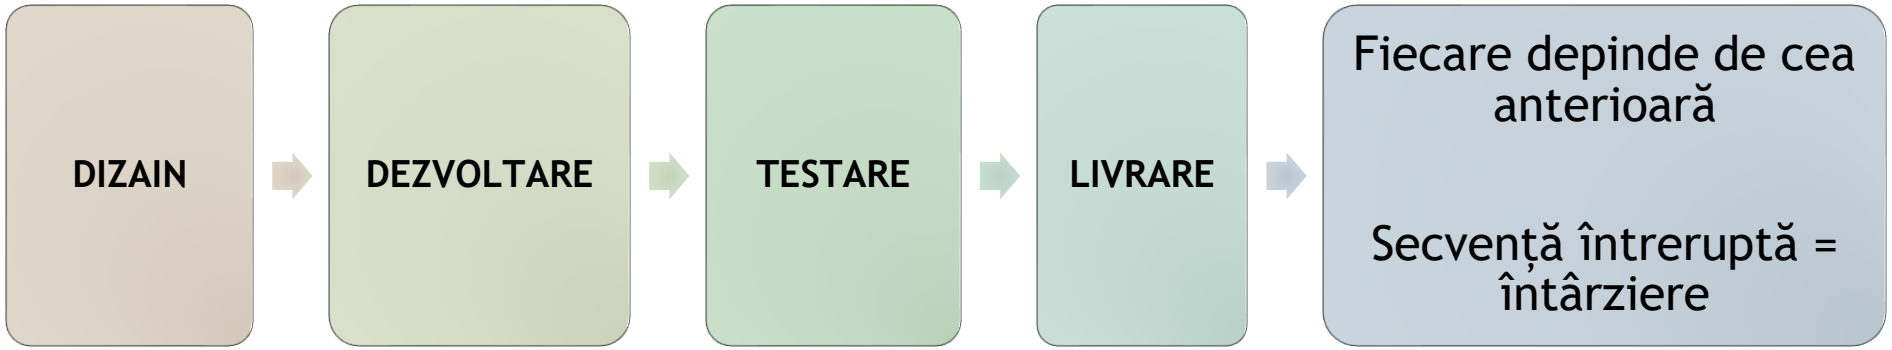

DEPENDENȚE ȘI RISCURI

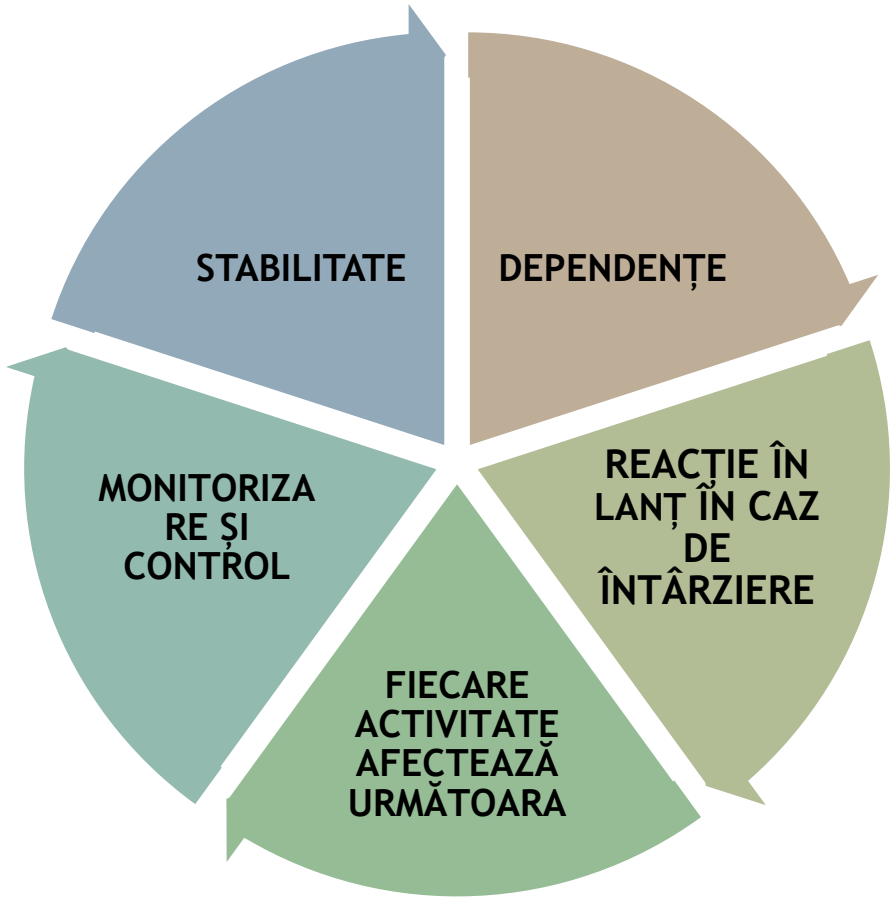

CE SUNT DEPENDENȚELE?

Tipuri de dependențe:

O activitate nu poate începe înaintea alteia

Legătura dintre timp, resurse și logică

Gestionarea lor = control asupra calendarului





TABEL DE DEPENDENȚE (PROIECT EXEMPLU)

Tipuri de dependențe:

O activitate nu poate începe înaintea alteia

Legătura dintre timp, resurse și logică

Gestionarea lor = control asupra calendarului

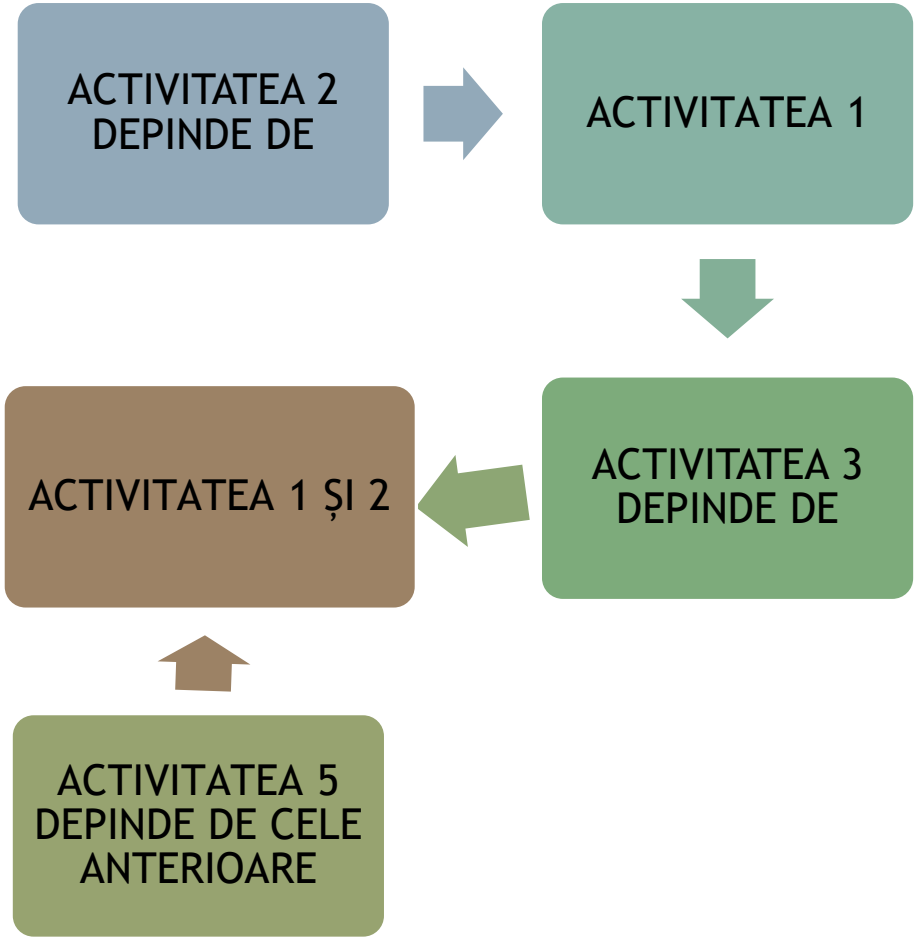

TIPURI DE DEPENDENȚE DUPĂ LOGICĂ ȘI TIMP

Tipuri principale:

Finish-to-Start (ex.: programare → testare)

Finish-to-Finish (două activități se termină împreună)

Start-to-Start (încep împreună)

Start-to-Finish (rar, dependență specifică)

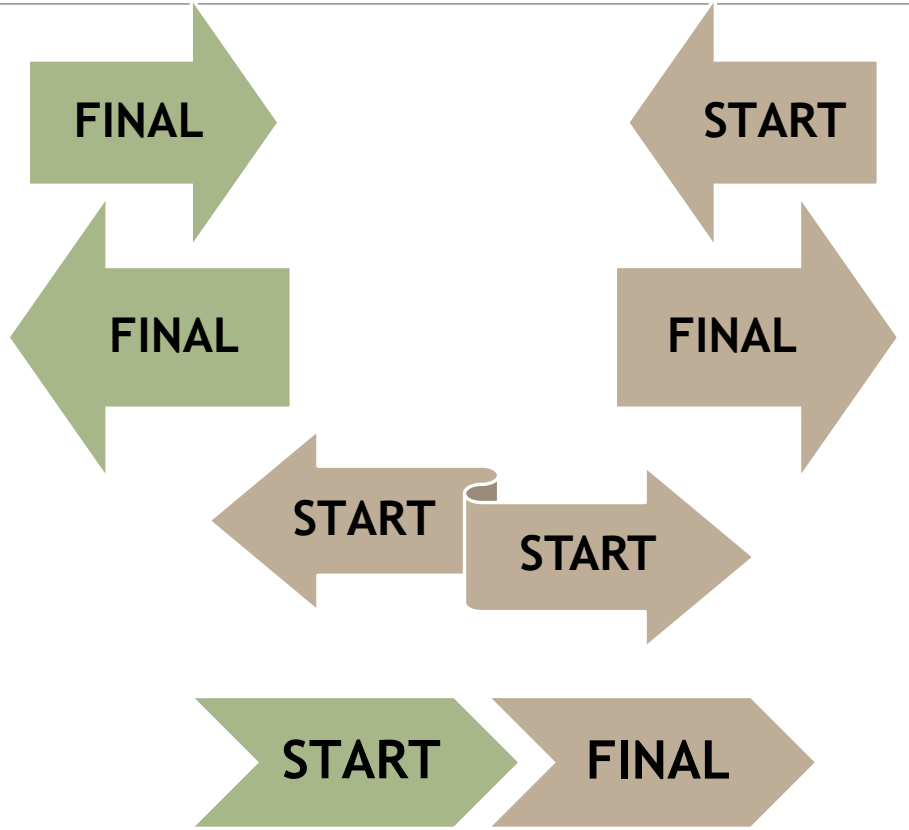

TIPURI DE RESURSE ÎN PROIECT

Resurse:

Tehnice

Financiare

Umane

Administrative și logistice



LEGĂTURA DINTRE ACTIVITĂȚI ȘI RESURSE

Fiecare activitate necesită resurse

Tehnice

Financiare

Umane

Logistice



ACTIVITĂȚI OBLIGATORII ÎN CADRUL PROGRAMELOR UE

Activități obligatorii:

Management

Publicitate

Evaluare și monitorizare



Publicitate și Comunicare

Publicitate și Comunicare:

Activitate obligatorie pentru proiectele finanțate din fonduri UE

Scop: informare, transparență, recunoașterea UE

Măsuri pentru vizibilitate, promovare și multiplicarea rezultatelor



Ghiduri de identitate vizuală și exemplu de program

- ✓ Fiecare program oferă ghiduri specifice de identitate vizuală
- ✓ Culori, sigle și fonturi
- ✓ Poziționarea elementelor și mesajelor
- ✓ Formulări și linkuri obligatorii



Exemplu: Interreg VI-A RO-BG – Communication Starter Kit

REZUMAT

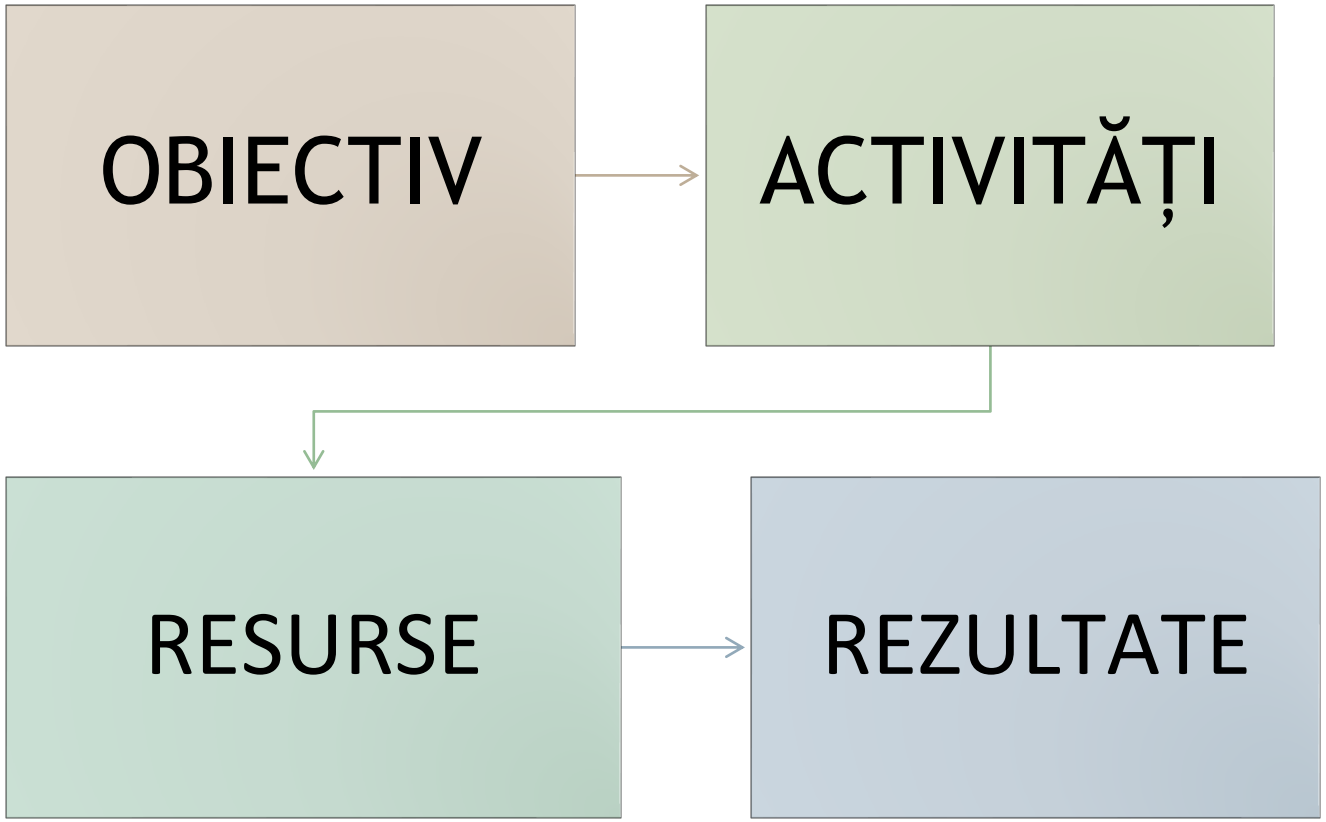

Inițiativă transfrontalieră pentru formarea și implicarea comunităților religioase
Fundația pentru Dezvoltare Regională
Data publicării: 04.04.2026
„Conținutul acestui material nu reprezintă neapărat poziția oficială a Uniunii Europene”
